

3. 추진실적

- 도시재생 거점시설 조성
 - 금사푸드&파크 및 공영주차장 준공 : 2023. 12.
 - 어울림센터 건립공사 착공 및 공사추진 : 2021. 11. ~ (공정률 70%)
- 도시재생 예비사업 추진에 따른 주민 커뮤니티공간 조성
 - 서동 플레이그라운드 및 실버가든 조성 공사 준공 : 2023. 2.
 - ※ 마을공동체 영상 콘텐츠 제작 역량강화 교육 실시 : 2023. 7. ~ 9.
- 도시재생 뉴딜 S/W사업 공동체 역량강화 프로그램 운영
 - 정든 프로그램 운영 : 기억채움 동행인 양성과정 등 9개 프로그램 137명 참여
 - 금사학교 외 프로그램 운영 : 골목길 스케치 등 17개 프로그램 525명 참여

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 서·금사지역은 대부분 지역이 재개발지역으로 지정 또는 추진 예정인 상황으로 재생 사업지 발굴에 애로가 있으며 공동체 활성화를 통한 마을 활력 증진 필요

5. 향후계획

- 2024. 5. : 금사 도시재생 어울림센터 준공
- 2024. 1. ~ 12. : 거점시설 활용 ‘주거복지 역량강화사업’ 추진

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

- 금사 도시재생 뉴딜사업 및 도시재생 예비사업(H/W)



금사 도시재생 어울림센터 조감도



금사푸드&파크 및 공영주차장 조감도




플레이그라운드 조성 완료(서1동)

- 금사 도시재생 뉴딜사업(S/W)



기억채움 동행인 양성과정

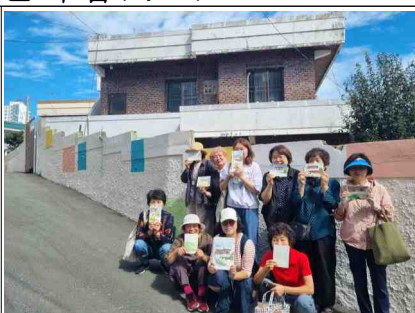

골목길 스케치 초급반



시니어 문화 공작소
