

1

서금사재정비촉진지구기반시설 설치 (서동로 확장공사)

담당부서 : 도시재생추진단 조일래 (☎519-5472)

주변 지역 연결 교통망 확충을 통해 서·금사 재정비촉진지구의 원활한 사업시행을 도모하고자 함.

□ 사업개요

- 사업위치 : 금정구 부곡동 온천천 ~ 반송로(파크랜드 옆)
- 사업기간 : 2009. ~ 2023.
- 사업규모 : 도로확장(L=2,189m, B=30m), 주차장, 공원 등
 - ▷ 도로확장 L=2,189m 중 L=893m 완료
- 총사업비 : 147,000백만원(도로분야 118,800백만원)
 - ▷ 도로확장 예산투입 : 47,621백만원(국 43,821, 시 3,600, 구 200)
- 사업내용 : 재정비촉진지구 내 기반시설(도로, 공원, 주차장) 설치


□ 추진현황

- 2010. 3. ~ 2011. 12. : 서동로 확장공사 실시설계용역
- 2010. 6. ~ 2012. 6. : 뉴타운교 설치공사(L=42m, B=34m)
- 2012. 2. ~ 2012. 6. : 서동로 확장공사 1차(L=25m, B=30m)
- 2012. 4. ~ 2013. 6. : 서동로 확장공사 2차(L=110m, B=12→20m)
- 2013. 2. ~ 2014. 11. : 서동로 확장공사 3차(L=170m, B=12→20m)
- 2014. 4. ~ 2015. 9. : 서동로 확장공사 4차(L=210m, B=12→18m)
- 2015. 1. ~ 2016. 8. : 서동로 확장공사 5차(L=190m, B=12→20m)
- 2015. 12. ~ 2016. 9. : 서동로 확장공사 6차(L=146m, B=7.4~20m)

□ 기대효과

- 시급한 교통정체 구간 도로를 확장하여 차량 소통 원활

□ 위치도

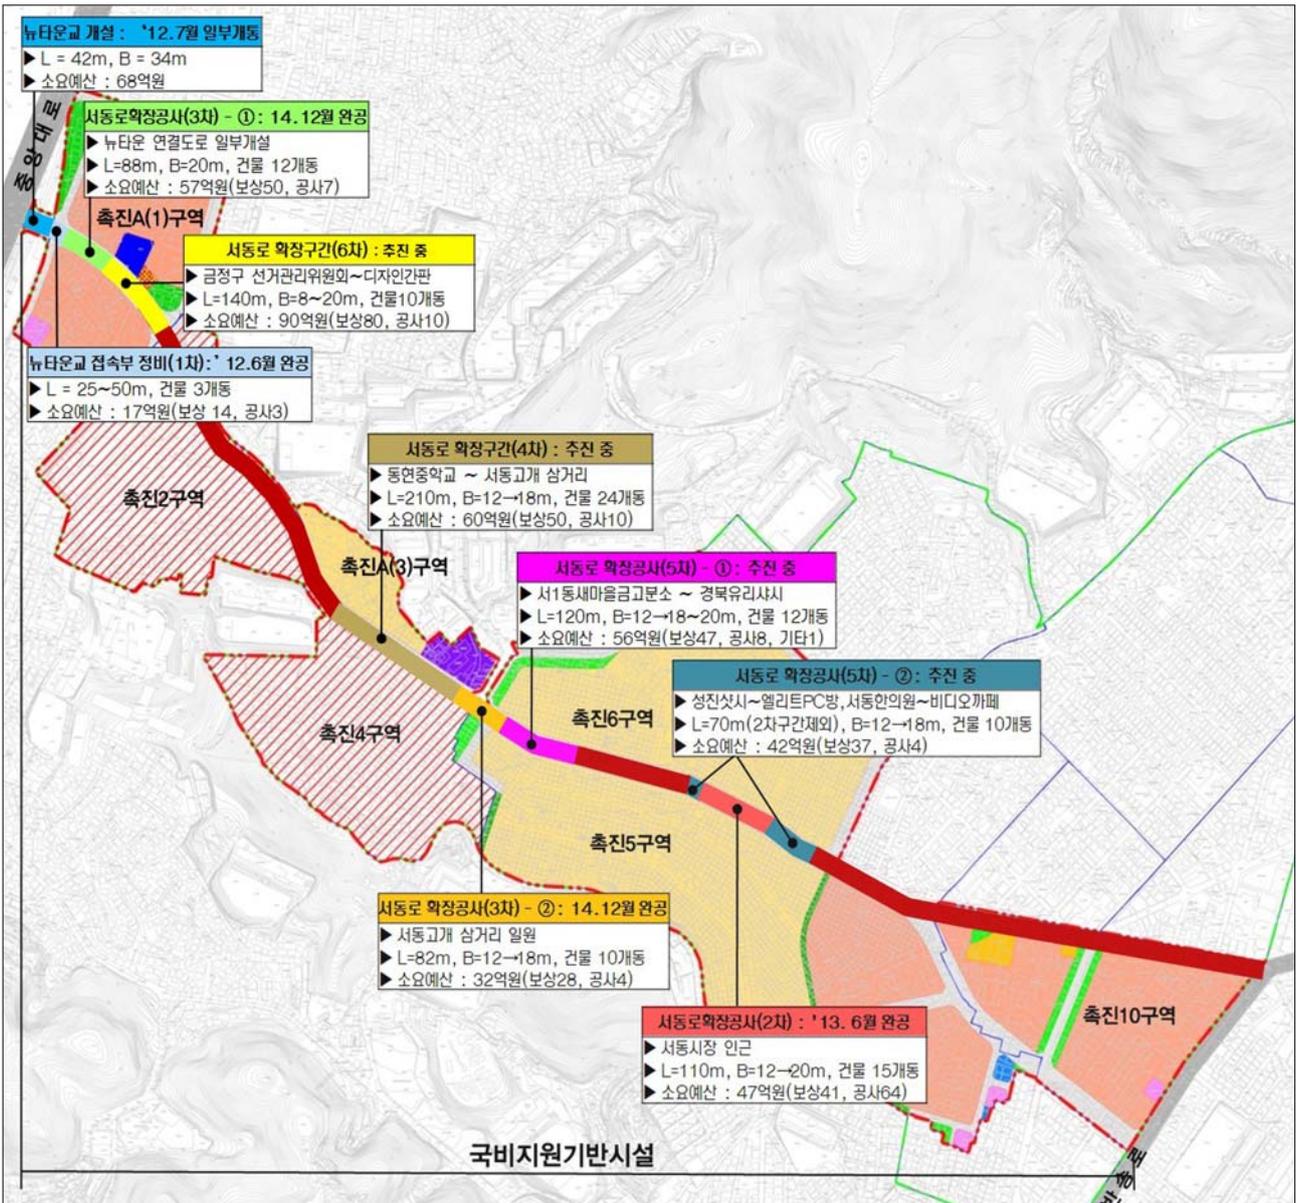

□ 현장사진



서동로 확장(3차)-①



서동로 확장(3차)-②



서동로 확장(4차)



서동로 확장(5차)-①
