

구청장 공약사항 관리카드

(2023. 12. 31. 現在)

공약제목	오륜동 인근 보행환경 개선			관리번호	4-3-1
주관부서	건설과	팀 장	시설6급 박지현 (☎4703)	관련부서	-
		담당자	시설7급 강정국 (☎4706)		
사업기간	2022 ~ 2026 [임기 내 완료]		소요예산	10,800백만원(국 4,500 시 800 구 5,500)	
추진상황	(추진중)		진 도	50% (=실적/추진과제)	
공약목표	○ 회동호 생태체험 누리길 조성사업('22년완료)과 더불어 오륜동 회관, 수원지마을 일원의 도로확장 및 개좌로 누리길 조성				
추진과제	○ 오륜동회관 일원 도로확장공사 ○ 오륜동 수원지마을 일원 진입도로 개설공사 ○ 개좌로 누리길 조성사업				

1. 추진개요

- 오륜동회관 일원 도로확장공사(4,900백만원)
 - ▷ 도로확장 L=327m, B=3m→8m
- 오륜동 수원지마을 일원 진입도로 개설 공사(4,400백만원)
 - ▷ 도로확장 L=707m, B=5m→8m
- 개좌로 누리길 조성사업(1,500백만원)
 - ▷ 보도설치 L=960m, B=2~2.5m

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총 계	10,800	200	2,130	4,127	2,843	1,500	
	국 비	4,500		630	977	1,543	1,350	
	시 비	800			800			
	구 비	5,500	200	1,500	2,350	1,300	150	
	기 타							
투입 예산	총 계	6,457	200	2,130	4,127			
	국 비	1,607		630	977			
	시 비	800			800			
	구 비	4,050	200	1,500	2,350			
	기 타							

3. 추진실적

- 오륜동회관 일원 도로확장공사
 - ▷ '08. 2. : 도시계획시설(도로) 결정(소로2-87호선)
 - ▷ '22. 1. ~ '22. 10. : 실시설계용역시행('22.6. 실시계획고시)
 - ▷ '22. 8. : 보상 절차(1차) 시행['23.6. 1차(L=245m) 보상완료]
 - ▷ '23. 6. : 공사 시행(1차, L=245m)
 - ▷ '23. 9. : 보상 절차(2차, L=82m) 시행
- 오륜동 수원지마을 일원 진입도로 개설공사
 - ▷ '15. 12. : 도시계획시설(도로) 결정(소로2-321호선)
 - ▷ '21. 2. ~ '21. 10. : 실시설계용역시행('21.11. 실시계획고시)
 - ▷ '21. 11. : 보상 절차(1차) 시행['23.2. 1차(L=350m) 보상완료]
 - ▷ '22. 12. : 보상 절차 시행(2차, L=357m)
 - ▷ '23. 12. : 1차구간 공사 착공(L=350m)

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 오륜동회관 일원 도로확장공사
 - ▷ 실시설계 및 감정평가 결과 보상비 증액 등으로 추가 사업비 확보 필요
- 오륜동 수원지마을 일원 진입도로 개설공사
 - ▷ 공시지가 상승 및 감정평가 결과 보상비 증액으로 추가 사업비 확보 필요
 - 2024년도 개발제한구역 주민지원사업 국고보조금(15억원) 교부 확정
 - 2023년 하반기 지역현안 특별교부세 용도변경 승인(6억원) 확정
 - 2024년도 추경 1차(3억원) 추가 신청 예정
- 개좌로 누리길 조성사업
 - ▷ 개발제한구역 주민지원사업 선정을 위한 사업비 확보 필요

5. 향후계획


- 오륜동회관 일원 도로확장공사
 - ▷ '24. 2. : 1차 공사 준공(L=245m)
 - ▷ '24. 3. : 2차 구간 보상완료(L=82m)
 - ▷ '24. 4. ~ '24. 12. : 2차 공사 시행(L=82m)
- 오륜동 수원지마을 일원 진입도로 개설공사
 - ▷ '24. 6. : 1차 공사 준공(L=350m)
 - ▷ '24. 7. ~ '25. 1. : 2차 공사 시행(L=357m)
- 개좌로 누리길 조성사업
 - ▷ '24. 2. : '25년 개발제한구역 주민지원사업 신청

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

○ 오륜동회관 일원 도로확장공사



○ 오륜동 수원지마을 일원 진입도로 개설공사

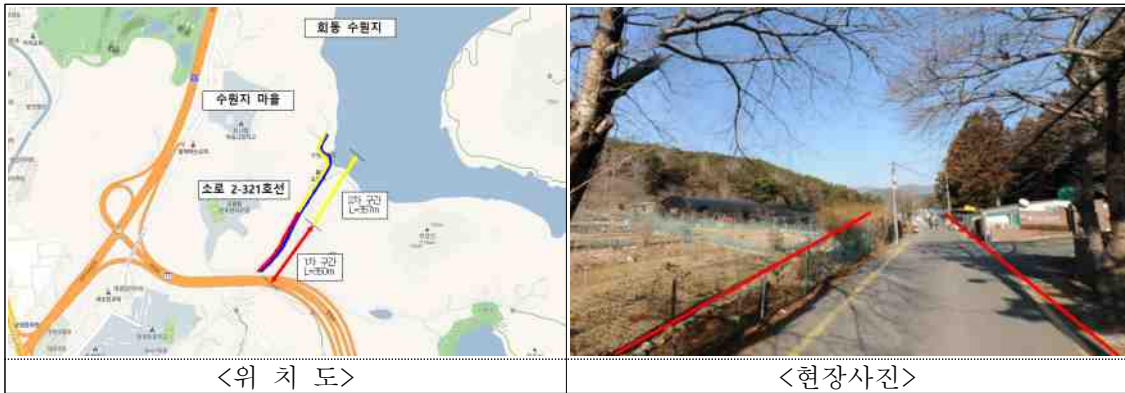

○ 개좌로 누리길 조성사업

